

**Администрация
Харьковского сельского поселения муниципального района
«Ровеньский район» Белгородской области**

**Благоустройство территории
улицы Центральная села
Харьковского Ровеньского
района Белгородской области**

2024 год.

Цель проекта:

К 15 ноября 2024 года обеспечить комфортное круглогодичное передвижение жителей села Харьковское по улице Центральная путём строительства тротуарной дорожки, не менее 510 м² и благоустройства прилегающей территории

Задача проекта :

Создание комфортных и безопасных условий для передвижения жителей села Харьковское Ровеньского района Белгородской области вдоль основной дороги по ул. Центральная в дневное и ночное время суток, по маршруту которой находится главный объект инфраструктуры: Харьковская средняя общеобразовательная школа, что требует повышенной безопасности движения для детей, а также объекты инфраструктуры: ОСВ, Детский сад, магазин, Дом культуры, почтовое отделение, сберкасса.

Обустроенные придомовые территории с цветниками и интересными дизайнерскими решениями.

Облагороженный внешний вид брошенных усадеб.

- **Целевая группа проекта** (пользователи проекта):
Жители и гости Харьковского сельского поселения

Ожидаемые результаты проекта:

Выполнены работы по благоустройству территории
улицы Центральная села Харьковское в объёме,
предусмотренном в 2024 году

- **Дата начала и окончания реализации проекта:**

15.04.2024 г. / 15.11.2024 г.

- **Стоимость реализации проекта:**

2 229 250,00 рублей;

- 2 199 500,00- средства областного бюджета

- 29 750,00 рублей - средства местного бюджета.


Актуальность проекта:

Улица Центральная — основная с круглосуточным автомобильным движением. В настоящее время пешеходное движение по улице Центральная, где проходит основной поток школьников, детей дошкольного возраста, идущих в школу, детский сад, а также их родителей. Запланированные мероприятия продолжат основной проект благоустройства территории Харьковского сельского поселения. В настоящее время по ул. Центральная расположена дорога с твердым покрытием, ширина 6 метров. Пешеходам приходится ходить либо по проезжей части данной дороги, либо по ее обочине, то есть грязи и траве. Поэтому проблема безопасного и комфортного движения пешеходов является одной из основных проблем жителей не только ул. Центральной, но и всех жителей села. В направлении центра ежедневно по дороге улицы Центральная движутся около 200 человек, в едином потоке идут люди и едут машины, велосипеды, что создает опасность и угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения. Благоустройство территории улицы Центральная с устройством тротуарной дорожки способно кардинально улучшить ситуацию, создать условия для комфортного и безопасного движения пешеходов.

Как есть:



Как будет:

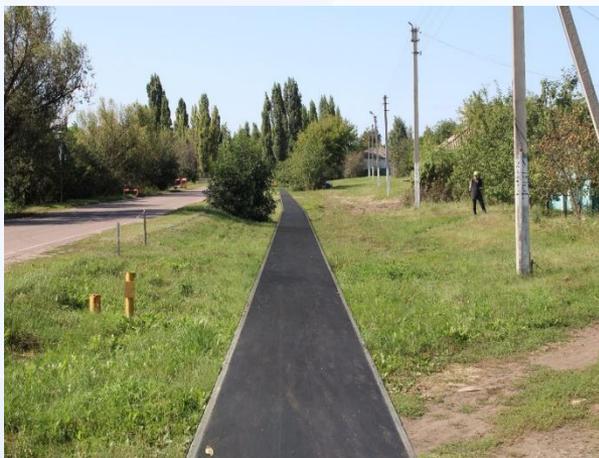

Планируемые результаты проекта:

- Построена тротуарная дорожка шириной не менее 510 м²
- Произведен спил сухих деревьев и кустарников по ул. Центральная на площади 1200 м²
- Обустроено 2 пешеходных перехода через водостоки
- Установлена «Доска объявлений»
- Благоустроено не менее 2 брошенных усадеб
- Высажено 5 саженцев туи возле скамеек вдоль тротуара в парке
- Высажены саженцы кустарников и деревьев вокруг детской площадки
- Осуществлен уход за въездной группой деревьев и кустарников (подвязка саженцев, выкос сорной растительности)
- Оформлены земельные участки под детскими площадками
- Работа с населением по обустройству клумб и цветников на придомовой территории по ул. Центральная
- Проведена покраска ограждения парка в с. Харьковское ул. Центральная, 100 м.

Календарный план-график реализации мероприятий проекта

Наименование контрольного события	Результат (документ подтверждающий выполнение контрольного события)	Дата	Фамилия И.О., должность ответственного исполнителя	Бюджет
Спил сухих деревьев и кустарников по ул. Центральная на площади 1200 м ²	Фотоотчет	01.05.2024	Снеговской Ю.И., глава администрации	1500,00
Благоустройство не менее 2 брошенных усадеб по ул. Центральная	Фотоотчет	01.06.2024	Снеговской Ю.И., глава администрации	1250,00
Высадка деревьев и кустарников вокруг детской площадки	Фотоотчет	01.06.2024	Садченко С.В., заместитель	0,00
Высадка саженцев туи возле скамеек вдоль тротуара в парке	Фотоотчет	01.06.2024	Садченко С.В., заместитель	0,00
Уход за въездной группой деревьев и кустарников (подвязка саженцев, выкос сорной растительности)	Фотоотчет, гражданско-правовой договор для выполнения работ по благоустройству территории	15.06.2024	Сюсюкало К.А., экономист-финансист администрации	0,00
Работа с населением по обустройству клумб и цветников на придомовой территории по ул. Центральная	Фотоотчет	01.07.2024	Садченко С.В., заместитель	0,00
Обустройство пешеходных переходов через водостоки (школа, Дом культуры)	Фотоотчет	01.08.2024	Снеговской Ю.И., глава администрации	0,00

Календарный план-график реализации мероприятий проекта

Уход за въездной группой деревьев и кустарников (выкос сорной растительности)	Фотоотчет, гражданско-правовой договор для выполнения работ по благоустройству территории	15.08.2024	Сюсюкало К.А., экономист-финансист администрации	0,00
Оформление земельных участков под детскими площадками	Договор на оказание услуг	01.09.2024	Сюсюкало К.А., экономист-финансист администрации	24000,00
Обустройство тротуарной дорожки по ул. Центральная с. Харьковское	Фотоотчет, договор на оказание услуг	01.10.2024	Подрядчик	2199500,00
Покраска ограждения парка в с. Харьковское ул. Центральная, 100 м.	Фотоотчет	01.10.2024	Садченко С.В., заместитель	3000,00
Установка «Доски объявлений»	Фотоотчет	15.11.2024	Снеговской Ю.И., глава администрации	0,00
			Итого:	2 229 250,00 руб.

Риски проекта

Наименование риска проекта	Ожидаемые последствия риска	Мероприятия по предупреждению	Действия в случае наступления риска
Неблагоприятные погодные условия	Срыв сроков реализации	Мониторинг погодных условий	Внесение изменений в план проекта
Не выполнение работ подрядчиком в установленные сроки	Срыв сроков реализации	Мониторинг выполнения работ	Внесение изменений в план проекта



Команда проекта



ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
Волощенко Александр Петрович	Врио заместителя главы администрации Ровеньского района – начальника управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК	Куратор проекта делегирует полномочия по руководству работами по осуществлению проекта: планированию, контролю и координации работ всех участников проекта
Снеговской Юрий Иванович	Глава администрации Харьковского сельского поселения	Руководитель проекта делегирует полномочия по руководству работами по осуществлению проекта: планированию, контролю и координации работ всех участников проекта
Садченко Светлана Викторовна	Заместитель главы администрации Харьковского сельского поселения	Член группы проекта Осуществляет своевременное предоставление отчетности по выполнению всех этапов проекта, освещения его в средствах массовой информации и т.д
Сюсюкало Ксения Александровна	Экономист-финансист администрации Харьковского сельского поселения	Член группы проекта Осуществляет оформление договоров на закупку и поставку товаров, работ и услуг
Коновалов Евгений Алексеевич	Ведущий специалист МКУ «Харьковская АХС»	Член группы проекта участвует в выполнении основных этапов работ проекта
Садченко Николай Алексеевич	Водитель МКУ «Харьковская АХС»	Член группы проекта участвует в выполнении основных этапов работ проекта
Волкова Людмила Александровна	Начальник МКУ «Харьковская АХС»	Член группы проекта участвует в выполнении основных этапов работ проекта
Харьковский Андрей Иванович	член ТОС «Ямчинский»,	Член группы проекта участвует в выполнении основных этапов работ проекта

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Повышена комфортность и безопасность жизни населения Харьковского сельского поселения Ровеньского района Белгородской области. В результате реализации проекта по благоустройству тротуарной дорожки по ул. Центральна села Харьковское создаётся безопасная среда для движения пешеходов на основе правильной организации пешеходного движения по ул. Центральная. Снижение рисков дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей, улучшение передвижения пешеходов по данному участку улицы. Работы по благоустройству общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения в границах Харьковского сельского поселения Ровеньского района Белгородской области выполненные в 2024 году станут основой для планирования и выполнения работ в 2025 году

**Администрация
Харьковского сельского поселения муниципального
района «Ровеньский район» Белгородской области**

**Спасибо за
внимание**

**«Благоустройство улицы Центральная на
территории села Харьковского Ровеньского
района Белгородской области».**

2024 год.
